


"MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA UN SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO CENTRALIZADO EN LA COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUINTANA ROO".


REPORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021







Elaboró: Lic. Ramón Arturo Parra Cruz.






Cargo: Director de Servicios Comunitarios.

Fecha: 30/06/2021.



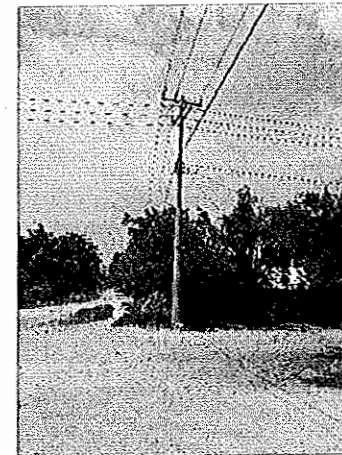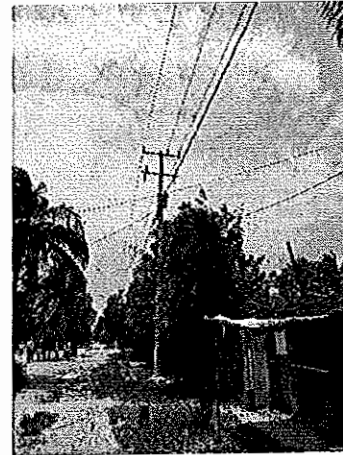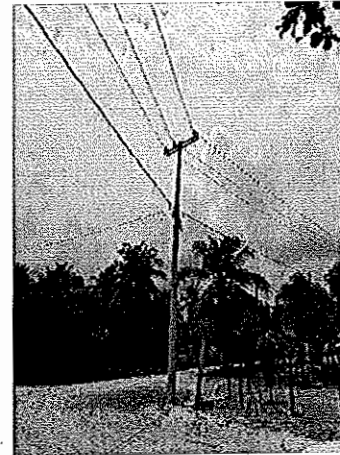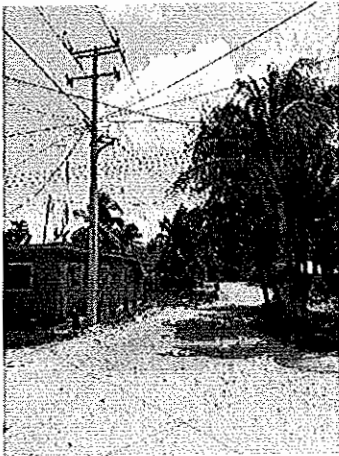


**Cableado, acometidas y postes
debidamente instalados al 100%.**

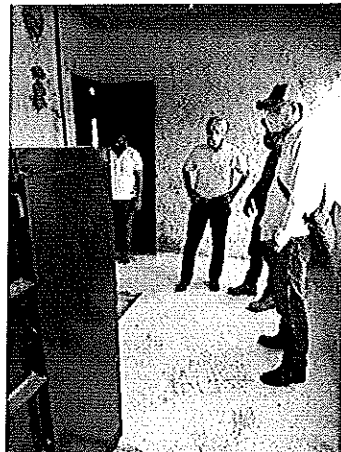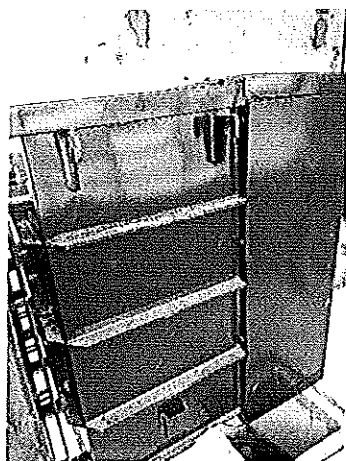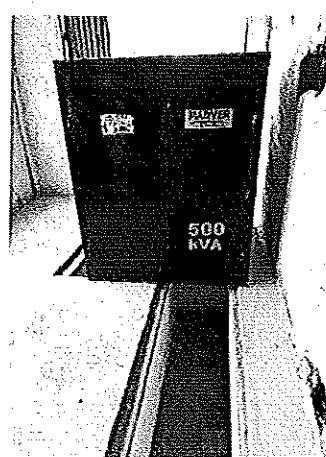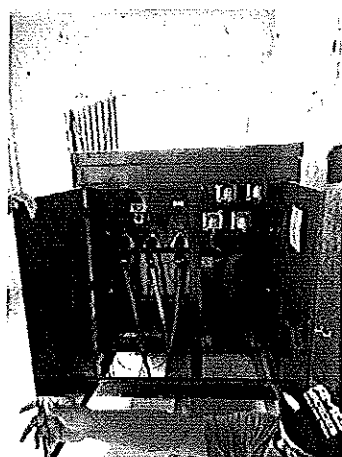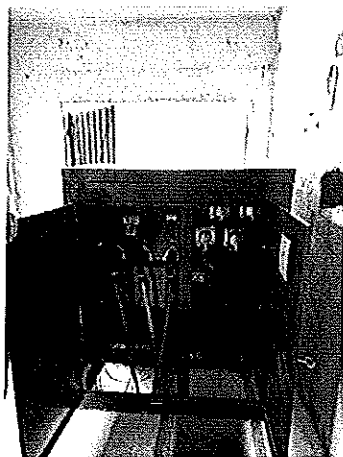

Transformador principal de la red de 500 KVA, instalado y operando.

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

DIRECCIÓN 2411- Dirección de Servicios Comunitarios

REPORTE TRIMESTRAL DE INDICADORES DEL PERÍODO 01/04/2021 AL 30/06/2021


Programa Presupuestario E032 - Infraestructura Social Básica.

Componente/Actividad F.P.C03.A02 - Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

Identificación del Indicador SEDESOT2C3A2 - Porcentaje de avance de la ejecución de la Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de La Biosfera de Sian Ka'an, Quintana Roo.

| INDICADOR | OBSERVACIONES AL AVANCE DE LA META EN EL PERÍODO |
|--|--|
| <p>Avance en la ejecución de la obra</p> | <p>La obra de la Modernización se encuentra debidamente concluida y migrada, actualmente en operación. No se ha cerrado su conclusión al 100% debido a que se están realizando pruebas de funcionamiento y registros para el informe que la Comisión Federal de Electricidad deberá entregar a la SEDESOS. Cabe mencionar que para este periodo de pruebas, la Comisión solicitó a la SEDESOS mediante oficio número VMSM-SEZGO-059-2021, una ampliación al Convenio de 45 días naturales, con la finalidad de dejar la red operando correctamente. La SEDESOS autorizó dicha ampliación mediante oficio SEDESOS/DS/SSDS/DPS/0354/MI/2021. El convenio modificadorio se encuentra en firma por parte de la Comisión en la ciudad de México.</p> <p>Por lo antes expuesto, aunque la obra se encuentra concluida y operando, no se puede registrar al 100% hasta que se llevé a cabo el acto de entrega recepción una vez cumplido el plazo de ampliación de 45 días, y contar con los documentos correspondientes.</p> |

ELABORÓ



Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios
