

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Parque Industrial Logístico con infraestructura construida.

Programa Presupuestario: E069 Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva

Indicador: C07. Porcentaje de avance en la construcción del parque industrial logístico.

Descripción: Mide el avance en la construcción de infraestructura para el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico

Trimestre: 2do. Trimestre 2021

Periodicidad: Semestral

Resultado: La meta anual es un avance del 3% en la Construcción del Parque Industrial. Al primer semestre del 2021, se cuenta con la construcción de la Caseta de Vigilancia y control de acceso en la entrada al parque industrial con RFE terminada. Lo que representan un avance del 1% con lo que se da cumplimiento del 100% de la meta establecida en el semestre.



BITÁCORA CONVENCIONAL DE OBRA

PERIODO

Del viernes, 4 de diciembre de 2020
 Al miércoles, 7 de julio de 2021

Ejecutor :

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SEOP)

Convenio

o

FAFEF-OP-029/2020

Contrato:

Hoja :

1 DE 2


ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN INTERNA

NOTA 01.- Reporte de avance en obra:

Fecha: **07 de JULIO de 2021**

FRENTES DE TRABAJO: . CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES - CONTROL DE ACCESO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: (PROGRAMADO). Se elaboro el diseño y proyecto ejecutivo de la Caseta de Vigilancia y control de acceso en la entrada al parque industrial con RFE, esto con el fin de encargarse de controlar el acceso de las personas, por medio de registros que marcan la hora de llegada y salida, las personas ajenas a la edificación tendrán acceso y con ayuda de este sistema será mucho más fácil saber qué personas están entrando a laborar. Entre los beneficios se tiene lo siguiente: Seguridad las 24 horas del día, Supervisión de cámaras de seguridad, Recepción, entre otros mas. A continuacion se presenta el plano de conjunto de la ubicacion de dicha caseta, asi como los renders de proyecto.

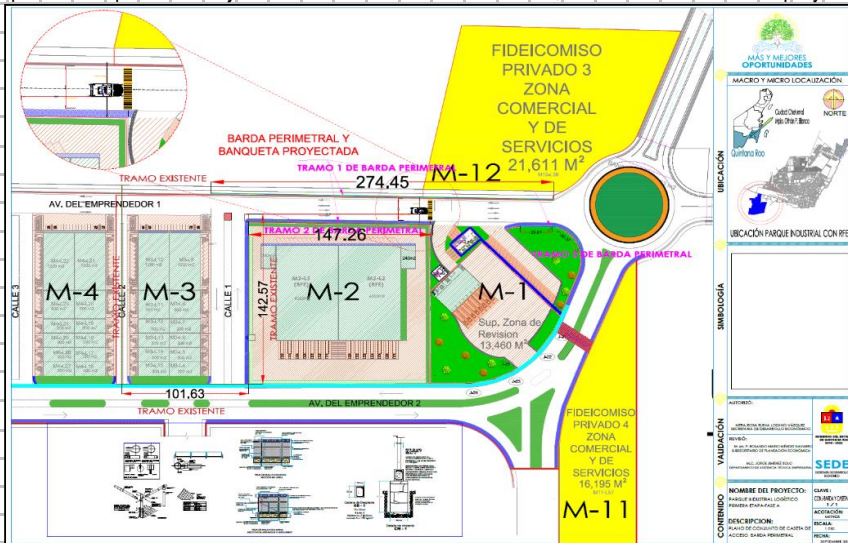

Se ha terminado la construcción de la Caseta de Acceso, así como con la ampliación de la barda perimetral .





REPORTE FOTOGRÁFICO

Convenio
o Contrato: **FAFEF-OP-029/2020**

Ejecutor: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
(SEDE)

Tipo de Obra :
NUEVA

Uso :
INDUSTRIAL

Fecha Prog. de Inicio :
4 de diciembre de 2020

Descripción :
CASETA DE CONTROL DE ACCESO A NAVES INDUSTRIALES

Fecha Prog. de terminación :
31 de diciembre de 2020

Ubicación :
CARRETERA FEDERAL MÉXICO 186 CHETUMAL- ESCÁRCEGA KM 267+ 450, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE OTHÓN P.BLANCO.

Superficie : m²
Duración : 27 días

ACTIVIDADES EJECUTADAS

miércoles, 7 de julio de 2021



VISTA LATERAL 1-SALIDA



VISTA LATERAL 2-ENTRADA



VISTA FRONTAL-ACCESO PERSONAL



VISTA TRASERA - ACCESO



VISTA TRASERA-SALIDA



BIODIGESTOR Y CISTERNA DE CASETA
